«Согласовано»
Заказчик:
ЗАО ИФК «ФинСибИнвест»
Генеральный директор

Федоров Д.М.

« » 2014 года

«Утверждаю»
Генеральный подрядчик:
ЗАО «ФинСибИнвест-Строй»
И.о. генерального директора

Бузанов В.В.

« » 2014 года

График

производства работ на объекте: многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Геодезической в г.Обь

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Срок: Начало работ	Срок: Длительность	Срок: Окончание
1	**Подготовительные работы**					
1.1	Планировка площадки	м2	4000	22.07.2014	3	24.07.2014
1.2	Устройство ограждения	м/пог	260	21.07.2014	3	23.07.2014
2	**Земляные работы**					
2.1	Разработка котлована	м3	5940	25.07.2014	7	31.07.2014
3	**Возведение монолитного ж/б каркаса здания**					
3.1	Комплекс работ по устройству свайного основания и фундаментной плиты	м3	741	01.08.2014	173	20.01.2015
3.2	Устройство каркаса до отм. 0.000	м3	594	11.01.2015	49	28.02.2015
3.3	Гидроизоляция, утепление наружних стен подземной части здания	м2		25.02.2015	14	10.03.2015
3.4	Обратная засыпка пазух котлована	м3		01.03.2015	10	10.03.2015
3.5	Устройство каркаса 1-19 этажи	м3	4407	21.02.2015	171	10.08.2015
3.6	Устройство парапета	м3	37	11.08.2015	10	20.08.2015
4	**Устройство внутренних стен и перегородок**					
4.1	Устройство внутренних стен	м2	6451	21.03.2015	143	10.08.2015
4.2	Устройство перегородок	м2	3540	21.03.2015	150	17.08.2015
5	**Устройство кровли здания**	м2	681,09	16.08.2015	36	20.09.2015
6	**Демонтаж башенного крана**	шт	1	22.08.2015	4	25.08.2015
7	**Фасадные работы**	м2	4037	01.04.2015	183	30.09.2015
8	**Установка оконных и дверных блоков**	м2		21.03.2015	184	20.09.2015
9	**Монтаж лифтового оборудования**	комплекс		11.08.2015	41	20.09.2015
10	**Устройство полов**	м2		21.06.2015	133	31.10.2015
11	**Отделочные работы**	м2		01.08.2015	142	20.12.2015
12	**Монтаж системы отопления**	комплекс		11.05.2015	123	10.09.2015
13	**Монтаж системы водоснабжения, водоотведения, внутреннего водостока, установка сан.технических приборов**	комплекс		11.05.2015	123	10.09.2015
14	**Монтаж системы вентиляции**	комплекс		11.02.2015	212	10.09.2015
15	**Монтаж системы внутреннего электроснабжения и освещения**	комплекс		21.05.2015	113	10.09.2015
16	**Монтаж внутренних слаботочных систем**	комплекс		11.09.2015	30	10.10.2015
17	**Монтаж системы пожарной сигнализации**	комплекс		11.10.2015	31	10.11.2015
18	**Благоустройство территории**	комплекс		01.08.2015	92	31.10.2015
19	**Наружние электрические сети**	комплекс		01.07.2015	31	31.07.2015
20	**Наружние тепловые сети**	комплекс		21.05.2015	72	31.07.2015
21	**Наружние сети В и К**	комплекс		21.05.2015	72	31.07.2015
22	**Пусконаладочные работы**	комплекс		11.11.2015	40	20.12.2015
23	**Сдача объекта**	комплекс		01.12.2015	25	25.12.2015

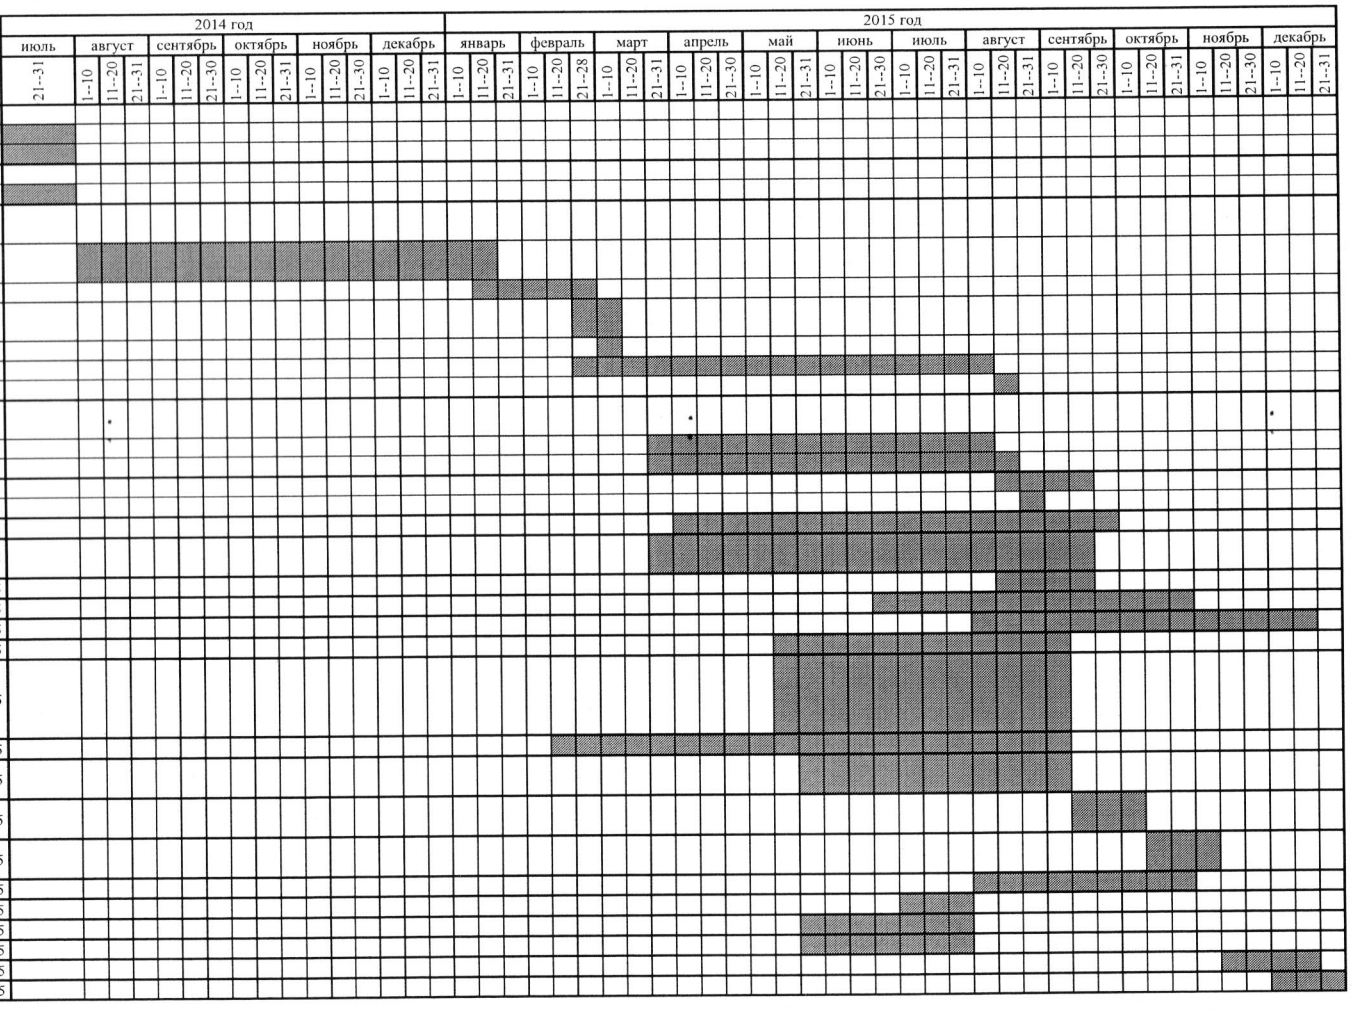

Составил: инженер ПТО Жарков А.И.
